


② MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE		Zpracoval: Úř. znak
Došlo: 17. 12. 2025	Č.j.:	Přílohy:

Zřízení optických kabelů Holice, dokončení úseku termín: 12.1. - 31.3.2026, I. etapa, dle úseku

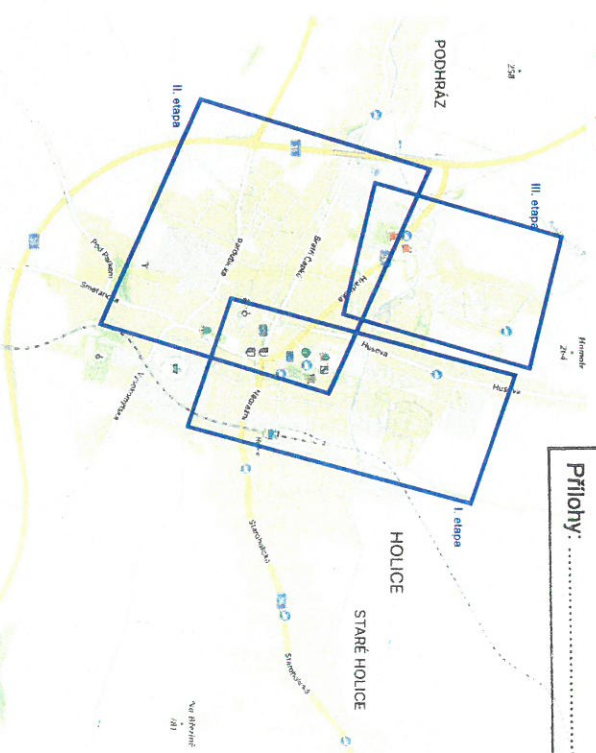

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno. Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou. Práce se předpokládají v délce 150 m denně a v co nejmenším zásahu do komunikací a chodníků. Výkopové práce v chodníku do 60 cm, v zeleni do 40 cm. Práce budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách.

V místech, kde nebude možný prolák, z důvodu kolize inženýrských sítí, se práce provedou překopem po 1/2 komunikace, ale přímátní jsou proláky.




Zpracoval: 		DZPCE Dopravní inženýrská společnost s r.o. IČO: 261 101 022 DIČ: CZ261101022 Sídlo: Holice, Masarykova 101 Kontaktní osoba: Mgr. David Fajna E-mail: info@dzpce.cz Telefon: +420 733 115 938	
Kreslil: Zdroj, projektant: Koordinoval: Kval. Pardubický Ověř. Holice	Běhla Pavlína / tel.: 601 545 513 David Fajna / 803 115 938 / info@dzpce.cz Ověř. Holice	Datum: 17.12.2025	Č. zakázky: SÚPEN PD MĚŘITVO FORMÁT: 9x43
Akce: optické kabely DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			

Zřízení optických kabelů Holice, dokončení úseků

termín: 12.1. - 31.3.2026, I. etapa, 14.2. - 28.2.2026, předpoklad 6 dní

Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou, možnost přechodových/přejezdových lávek.
DZ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.

celková délka trasy cca 178m

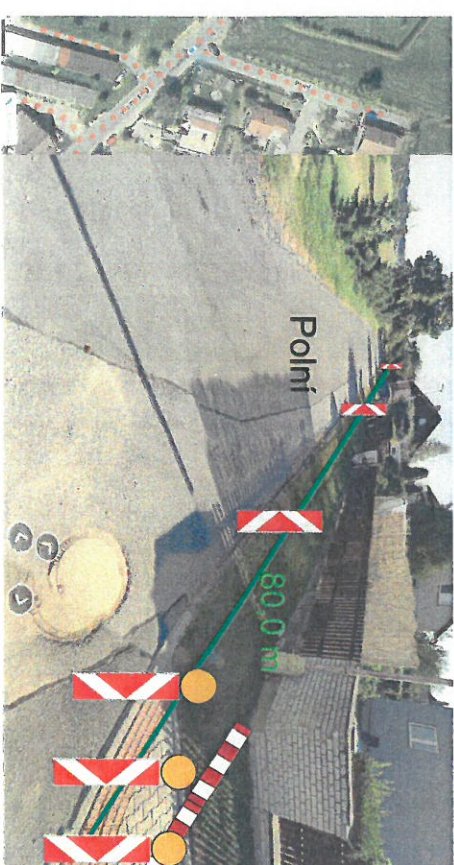

Vymístění vozidel - osazení DZ 7 dní
před plánovanými pracemi.

celková délka trasy cca 520m



Zřízení optických kabelů Holicе, dokončení úseků

termín: 12.1. - 31.3.2026, I. etapa: 23.3. - 31.3.2026, předpoklad 5 dní

DZ bude posunováno a dle
potřeby zrcadlově přemísťováno
v závislosti na postupu prací.

Zábory v zelení budou
zabezpečeny zábranami.




protlak

přechodová/přejezdová lávka
bude osazena dle potřeby
na vstupech do objektů a dle
koordinace se stavbou.



E 13 bude osazena
před aktuálním záбором


zábor chodníku



úsek 4

OD 211

pracovní místo



50 - 100
