


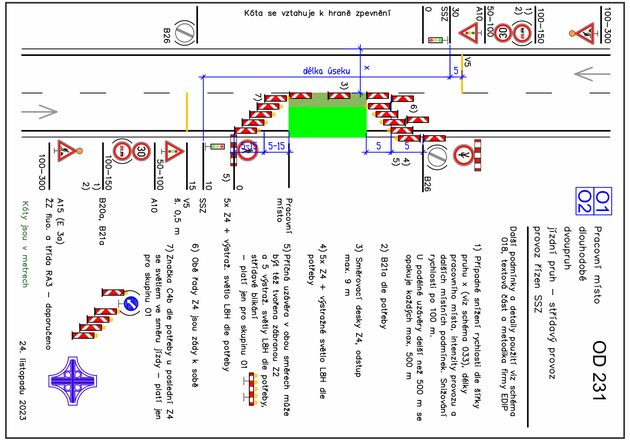

TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Navržená přechodná úprava provozu řeší dopravní situaci při výstavbě vodovodu, v Holicích (okr. Pardubice).
Návrh DIO je v souladu s příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl všeobecná část a schematická řada O. Jako základní je navrženo schéma OD 231 po úpravě.
Pracovní místo délky cca 350 m bude po ukončení pracovní doby a v mimopracovní dny vyklizeno, dopravní značení Z4 staženo na okraj silnice a SSZ otočeno do prostoru chodníku pro zajištění obousměrného provozu stavbou.
Přilehlý chodník bude uzavřen pomocí DZ B30 a Z2.

PRACOVNÍ MÍSTO OD 230

Souhlasíme s návrhem přechodné úpravy provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním.
Zároveň se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

Objednatel:

Autor projektu	DIOZ - dopravní značení	
Kreslil	Jaroslav Michek - 777 814 646	
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Holice

Akce:

I/36 HOLICE, STAROHOLICKÁ
VÝSTAVBA VODOVODU

DIOZ dopravní značení
Jaroslav Michek
Polzy 4, 503 26 Osice
tel. + 420 777 814 646,
e-mail: info@dioz.cz
www.dioz.cz
IČO: 68461135
DIČ: CZ6709060347

Datum	04/2026
Stupeň PD	DIO
Měřítko	-
Formát	4xA4
